BUAP

INGENIERÍA DE SOFTWARE II

SPRINT PLANNING 0

PROYECTO:
DAIN Studio — Sitio Web

DOCENTE:
ROBERTO ELVIRA ENRIQUEZ

INTEGRANTES:
ALEXIA DAYAN ALVAREZ BADILLO
INGRID ANDREE GONZÁLEZ LÓPEZ

2026

OBJETIVO DEL SPRINT 0

Desarrollar la página base del sitio web de DAIN Studio, un taller de fotografía profesional ubicado en Puebla, Puebla. La página base incluye la estructura HTML completa de todas las páginas del sitio, el archivo CSS global con los estilos visuales, y la navegación entre páginas.

Entregable: Archivo .zip con todo el código fuente del proyecto (HTML, CSS, imágenes, videos) + este documento de documentación.

ALCANCE DEL PROYECTO

1. Descripción general

DAIN Studio es un sitio web institucional y portafolio para un estudio de fotografía profesional. El sitio presenta los servicios fotográficos del estudio, casos de éxito con clientes reales, información sobre el equipo y medios de contacto.

2. Descripción general

#	Página	Archivo	Descripción
1	Inicio	index.html	Página principal con hero, servicios destacados, testimonios y formulario de contacto
2	Fotografía Comercial	comercial.html	Catálogo de servicios comerciales (producto, gastronomía, arquitectura, campañas, video)
3	Fotografía de Retrato	retrato.html	Catálogo de servicios de retrato (profesional, parejas, boudoir, book, artístico)
4	Casos de Éxito	proyectos.html	Portafolio con 4 proyectos realizados para clientes reales
5	Nosotros	nosotros.html	Información del estudio, misión, visión y filosofía
6	Contacto	contacto.html	Formulario de contacto detallado, mapa de ubicación y datos del estudio

3. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Versión	Uso
HTML5	Estándar	Estructura de todas las páginas
CSS	Estándar	Estilos visuales, layout, tipografía, colores
Google Fonts	Inter + Playfair Display	Tipografía del sitio
SVG	—	Iconos de redes sociales y elementos decorativos
Imágenes	Unsplash (placeholder)	Contenido visual del sitio

BACKLOG DEL SPRINT 0

Lista de tareas que se realizaron para crear la página base del proyecto, ordenadas por orden de desarrollo.

Épica 1: Estructura HTML

ID	Tarea	Descripción	Estado
H-01	Crear estructura base *HTML5*	Crear el esqueleto HTML5 con <!DOCTYPE html>, <head>, <body>, meta tags	✓ *Hecho*
H-02	Crear Navbar global	Diseñar la barra de navegación con logo "DAIN STUDIO" y menú de 5 opciones	✓ *Hecho*
H-03	Implementar navbar en todas las páginas	Copiar la misma navbar en las 6 páginas del sitio	✓ *Hecho*
H-04	Crear *index.html* completo	Hero, sección "Más que solo fotografía" con 5 feature cards, cuadrícula de servicios, testimonios, formulario de contacto, redes sociales	✓ *Hecho*
H-05	Crear *comercial.html*	Header de categoría + 5 blocks de showcase (foto producto, gastronomía, arquitectura, campañas, video)	✓ *Hecho*
H-06	Crear *retrato.html*	Header descriptivo + grid de 6 tipos de retrato con imágenes y overlay de título	✓ *Hecho*
H-07	Crear *proyectos.html*	Grid de 2 columnas con 4 tarjetas de casos de éxito (La Casa de Toño, Chanel, Marriott, Dior)	✓ *Hecho*
H-08	Crear *nosotros.html*	Hero con imagen de fondo, bloques de sectores (comercial/personas), sección de filosofía con Misión y Visión	✓ *Hecho*
H-09	Crear *contacto.html*	Grid de 2 columnas: formulario completo a la izquierda + mapa de Google + dirección + redes sociales a la derecha	✓ *Hecho*

Épica 2: Estilos CSS

ID	Tareas	Descripción	Estado
C-01	Configurar fuentes y reset	Importar Google Fonts (Inter + Playfair Display), *reset global con box-sizing: border-box*	✓ *Hecho*
C-02	Estilar Navbar	Fondo verde *#556653*, logo con tipografía elegante, links con hover effect	✓ *Hecho*
C-03	Estilar Hero (index)	Imagen de fondo con opacidad, texto centrado, botones primario y secundario	✓ *Hecho*
C-04	Estilar Feature Cards	Grid de 5 columnas con iconos SVG, bordes divisores, hover con cambio de color	✓ *Hecho*
C-05	Estilar Servicios	Grid de 3 columnas con imágenes grandes, hover con efecto escala	✓ *Hecho*
C-06	Estilar Testimonios	Grid de 3 tarjetas con estrellas SVG, citas, avatares con iniciales	✓ *Hecho*
C-07	Estilar Formulario de contacto (index)	Formulario minimalista con bordes inferiores, botón centrado	✓ *Hecho*
C-08	Estilar Sección redes sociales	Fondo verde oscuro, iconos SVG de Facebook e Instagram con hover	✓ *Hecho*
C-09	Estilar Footer	Texto centrado, borde superior, color gris suave	✓ *Hecho*
C-010	Estilar *comercial.html*	Showcase blocks alternados *(imagen izquierda/derecha)*, tarjetas oscuras con botón	✓ *Hecho*
C-011	Estilar *retrato.html*	Grid de retratos con imágenes *480px*, overlay de título con gradiente, botón	✓ *Hecho*
C-012	Estilar *proyectos.html*	Grid 2 columnas, tarjetas con imagen *400px*, caja de info oscura con tag	✓ *Hecho*
C-013	Estilar *nosotros.html*	Hero con imagen de fondo y overlay, bloques de sectores, sección filosofía con cards	✓ *Hecho*
C-014	Estilar *contacto.html*	Grid 2 columnas, formulario con bordes redondeados, mapa con shadow, datos del studio	✓ *Hecho*
C-015	Ajustes responsivos	Media queries para móvil en *proyectos.html* y *contacto.html*	✓ *Hecho*
C-016	Limpieza de código	Eliminar CSS duplicado, unificar selectores repetidos, corregir *@import de Google Fonts*	✓ *Hecho*

Épica 3: Recursos y Assets

ID	Tareas	Descripción	Estado
A-01	Obtener imágenes de placeholder	Seleccionar imágenes de Unsplash para todas las secciones del sitio	✓ *Hecho*
A-02	Crear referencia de video	Configurar elemento <*video*> en *comercial.html* que apunta a *videos/video-comercial.mp4*	✓ *Hecho*
A-03	Insertar mapa de Google	Embed de Google Maps con ubicación del estudio en Puebla	✓ *Hecho*
A-04	Crear iconos SVG	Iconos personalizados para Facebook, Instagram, estrellas, y feature cards	✓ *Hecho*

DESGLOSE TÉCNICO — CÓMO SE PROGRAMÓ

1. Estructura HTML

Decisión	Detalle	Justificación
Semántica HTML5	Uso de <*header*>, <*nav*>, <*main*>, <*section*>, <*footer*>	Accesibilidad y SEO
Archivos separados	Cada página es un *.html* independiente	Navegación clara, fácil de mantener
CSS externo	Archivo único styles.css vinculado con <*link*>	Código reutilizable, fácil de mantener
Imágenes externas	URLs directas de Unsplash	No requiere carpeta de imágenes local
Iconos SVG	SVG inline directamente en el HTML	Escalables, ligeros, sin dependencias externas

2. Sistema de diseño CSS

Aspecto	Valor	Justificación
Paleta de colores	Verde principal: ***#556653*** Texto oscuro: ***#242924*** Texto secundario: ***#586157*** Fondo: ***#fafbfa***	Verde transmite profesionalismo, naturaleza y elegancia — apropiado para un estudio fotográfico
Tipografía títulos	*Playfair Display (serif)*	Elegante, editorial, asociada a fotografía de alta gama
Tipografía cuerpo	*Inter (sans-serif)*	Moderna, legible, profesional
Layout	Flexbox + CSS Grid	Flexbox para navbar y alineaciones; Grid para cuadrículas de contenido
Transiciones	*transition: all 0.3s ease*	Animaciones suaves en hover, interacción fluida
Responsive	Media queries en *768px*	Breakpoint estándar para cambiar de desktop a móvil

3. Componentes reutilizables

Componente	Clase CSS	Usado en
Botón primario	*.btn.btn-primary*	Home, Comercial, Contacto
Botón secundario	*.btn.btn-secondary*	Home (index)
Botón showcase	*.btn.btn-showcase*	Comercial
Botón retrato	*.btn.btn-retrato-projects*	Retrato
Botón contacto	*.btn.btn-contacto-send*	Contacto
Imagen con sombra	*.showcase-img* / *.retrato-img* / *.proyecto-img*	Varios
Tarjeta de info	*.showcase-card* / *.philosophy-card* / *.testimonial-card*	Varios

ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. Desarrollador Frontend / Líder Técnico

Alexia Dayan Alvarez Badillo

Responsabilidades:

- Desarrollo de toda la estructura HTML de las 6 páginas
- Desarrollo completo del archivo CSS con estilos globales y por página
- Implementación del sistema de diseño (colores, tipografía, componentes)
- Limpieza y optimización del código
- Integración de recursos externos (Google Fonts, Unsplash, Google Maps)

Tareas realizadas:

- H-01, H-02, H-03, H-04, H-05, H-06, H-07, H-08, H-09
- C-01, C-02, C-03, C-04, C-05, C-06, C-07, C-08, C-09, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-16
- A-01, A-02, A-03, A-04

Horas invertidas: ~35-40 horas

2. Diseñadora UX/UI / Asistente de Desarrollo

Ingrid Andreé González López

Responsabilidades:

- Conceptualización del diseño visual del sitio
- Selección de paleta de colores y tipografías
- Selección de imágenes de Unsplash para cada sección
- Asistencia en la revisión de consistencia visual entre páginas
- Validación de la estructura del sitio y navegación

Tareas realizadas:

- H-02 (diseño del navbar visualmente)
- H-04 a H-09 (revisión de estructura y contenido)
- C-01 (selección de fuentes)
- C-01 a C-16 (revisión de estilos y consistencia visual)

- A-01 (selección de imágenes)
- A-04 (diseño de iconos SVG)

Horas invertidas: ~15-20 horas

3. Justificación de la distribución

Aspecto	**Dayan**	**Ingrid**
Código HTML	Principal	Colaborativa
Código CSS	Principal	Colaborativa
Diseño visual	Soporte	Principal
Selección de imágenes	Soporte	Principal
Iconografía	Soporte	Principal
Revisión de calidad	Ambos	Ambos

CALENDARIZACIÓN — CRONOGRAMA DE TRABAJO

El Sprint 0 se desarrolló en 5 días
(Miércoles 14 a Domingo 18 de octubre de 2026).

OCTUBRE						
Domingo	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	**14** Definición Creación Diseño index.html commercial.html	**15** retrato.html proyectos.html nosotros.html contacto.html	**16** Imagenes Video Mapa Google Iconos Fuentes y reset Navbar y hero	**17** Estilar: Feature Cards Servicios) Testimonios Formulario Redes sociales Footer comercial.html retrato.html proyectos.html
18 Estilar: nosotros.html contacto.html Responsividad Limpieza de CSS Pruebas Redactar Sprint Archivo .zip	**19** Entrega	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

1. Cronograma detallado

MIÉRCOLES 14 (Día 1) | Planificación y Estructura Base

- Definición del alcance y páginas del sitio
- Creación del esqueleto HTML5 (H-01)
- Diseño conceptual del navbar (H-02, H-03)
- Crear index.html completo (H-04)
- Crear comercial.html (H-05)

JUEVES 15 (Día 2) | Páginas de Servicios

- Crear retrato.html (H-06)
- Crear proyectos.html (H-07)
- Crear nosotros.html (H-08)
- Crear contacto.html (H-09)

VIERNES 16 (Día 3) | Recursos Externos y Estilos Globales

- Obtener imágenes de Unsplash (A-01)
- Configurar video (A-02)
- Insertar mapa de Google (A-03)
- Crear iconos SVG (A-04)
- Configurar fuentes y reset (C-01)
- Estilar navbar (C-02)
- Estilar Hero (C-03)


SÁBADO 17 (Día 4) | Estilos de Home y Páginas Internas

- Estilar Feature Cards (C-04)
- Estilar Servicios (C-05)
- Estilar Testimonios (C-06)
- Estilar Formulario (C-07)
- Estilar Redes sociales (C-08)
- Estilar Footer (C-09)
- Estilar comercial.html (C-10)
- Estilar retrato.html (C-11)
- Estilar proyectos.html (C-12)

DOMINGO 18 (Día 5) | Estilos Finales, Limpieza y Entrega

- Estilar nosotros.html (C-13)
- Estilar contacto.html (C-14)
- Ajustes responsivos (C-15)
- Limpieza de código CSS (C-16)
- Pruebas en navegadores
- Redactar este Sprint Planning
- Preparar archivo .zip para entrega

2. Resumen visual del cronograma

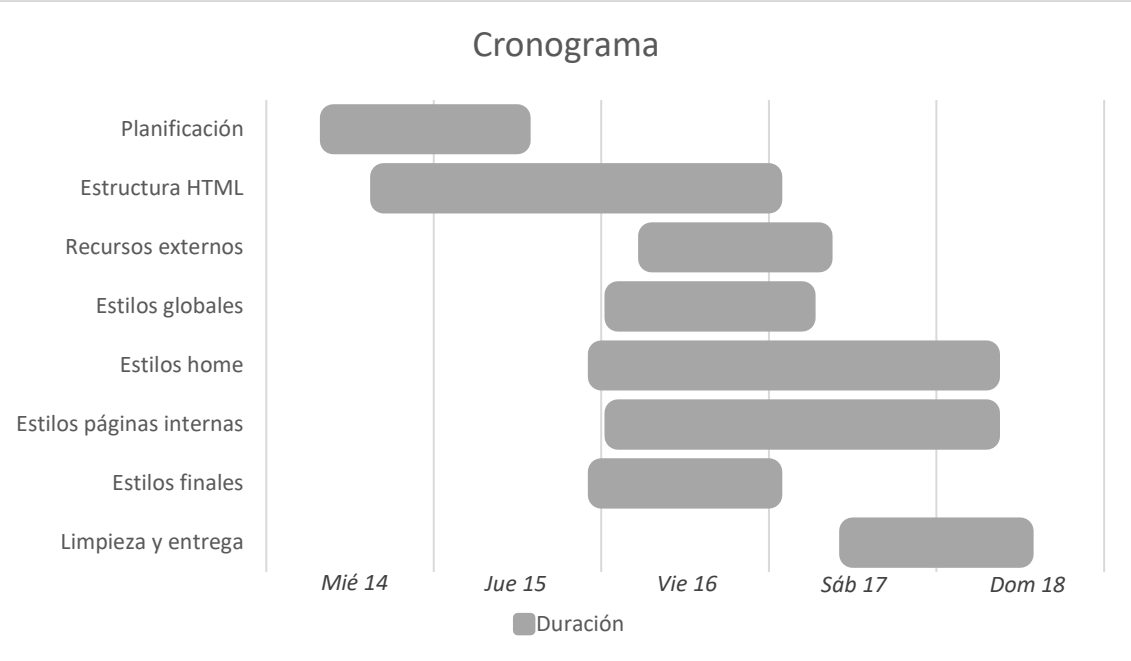

3. Resumen de horas por día

Día	Dayan	Ingrid	Total
Miércoles 14	6h	3h	**9h**
Jueves 15	7h	3h	**10h**
Viernes 16	5h	3h	**8h**
Sábado 17	8h	4h	**12h**
Domingo 18	5h	3h	**8h**
TOTAL	**31h**	**16h**	**47h**

DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOA)

Cada tarea se considerará terminada cuando se cumplan TODOS estos criterios:

Criterio	Descripción
Código funcional	El HTML y CSS se ejecutan sin errores
Navegación operative	Todos los links del menú funcionan y llevan a la página correcta
Consistencia visual	El navbar, colores y tipografía son iguales en las 6 páginas
Responsive básico	El sitio se ve correctamente en escritorio y tiene ajustes para móvil
Imágenes cargan	Todas las imágenes de Unsplash se visualizan correctamente
Código limpio	No hay HTML/CSS duplicado ni innecesario
Documentación	Este Sprint Planning está completo y actualizado
Archivo ZIP	Todo el código está empaquetado y listo para entrega

CONCLUSIÓN

El Sprint Planning 0 de DAIN Studio permitió planificar de manera estructurada el desarrollo de la página base del sitio web, definiendo claramente el alcance, las tareas, los roles, los tiempos y los entregables. A lo largo de 5 días de trabajo (del miércoles 14 al domingo 18 de octubre de 2026), el equipo logró desarrollar la estructura HTML completa de las 6 páginas del sitio, el archivo CSS con todos los estilos visuales, y la integración de recursos externos como imágenes, videos y mapas.

La distribución de trabajo fue liderada por Dayan en la parte técnica (desarrollo de HTML y CSS), mientras que Ingrid colaboró activamente en la toma de decisiones de diseño, integración de videos, selección de imágenes y revisión de calidad visual. Cada miembro aportó según sus fortalezas y disponibilidad, cumpliendo con los objetivos planteados para este sprint.

El proyecto DAIN Studio cuenta actualmente con una base sólida y bien organizada que servirá como fundamento para los siguientes sprints, donde se integrarán funcionalidades como el sistema de login, el carrusel de productos, la responsividad completa del sitio y el formulario de contacto funcional. Esta planificación inicial demostró que con una buena organización, definición clara de responsabilidades y un cronograma realista, es posible entregar un proyecto completo sin contratiempos.
